

Условные обозначения:

Емкость для исходной воды Емкость для чистой воды Емкость для промывной воды (подземн.) Септик объемом 5 м3 (подземн.) Канал для трубопроводов (подземн.) Ворота стройплощадки Ограждение стройплощадки Направление движения грузового транспорта Информационный щит Стенд с противопожарным инвентарём Пинкт мойки колес Временный дорожный знак Место стоянки автокрана Рабочая зона автокрана Опасная зона работы автокрана Городок строителей Переносные светильники Отметка ноля проектируемого здания

Граница отвода участка

Условная граница производства работ

Геодезические координаты привязки сооружений

Все работы выполняются под руководством ответственного за производство работ. Примечание: 1. Подача материалов в зону монтажа выполняется автомобильным краном с рабочим вылетом стрелы 15 м и грузоподъемностью на этом вылете 4.3 т. 2. Все работы, связанные с устройством фундаментов (рытье котлованов, установка фундаментов, обратная засыпка и т.д.) должны производиться в строгом соответствии с указаниями раздела СП 22.13330.2011 "Основания Площадка для подъезда ремонтной техники зданий и сооружений" (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01 83). 3. При выполнении работ руководствоваться требованиями СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-2002, Техническим регламентом о пожарной безопасности и другими нормативно-техническими документами о безопасности труда в строительстве.

максимально тяжелому элементу и строительно-монтажных условий.

Подачу строительных материалов производить при помощи крана КС-55413.

– Работы предлагается вести последовательным методом комплексной бригадой.

Общие положения

указать места размещения средств пожаротушения, источники воды, места для курения в соответствии с ГОСТ 12.114 – 82. 5. При выезде строительного транспорта с территории строительной площадки организовать мойку колес и днища

При выполнении работ руководствоваться требованиями СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-2002, Техническим

все элементы, образующие жесткую блок-секцию каркаса, и затем переходят к сборке очередной секции.

Так же не менее чем два человека из состава бригады должны быть аттестованными стропальщиками.

регламентом о пожарной безопасности и другими нормативно-техническими документами о безопасности труда в

При монтаже металлических конструкций применяют метод секционной сборки, т. е. последовательно монтируют

Монтажные работы выполняются с помощью автокрана г/п 25 т, вылетом стрелы до 38 м. Автокран подобран по

грузового транспорта с комплектом оборудования серии "Мойдодыр" с системой обратного водоснабжения. 6. Все строительные материалы поставляются на объект по мере необходимости. 7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на территорию строительного объекта вызываются сотрудники

4. При въезде на строительную площадку установить Паспорт объекта с планом пожарной защиты, на котором

- ближайшей пожарной части. 8. При работах в стесненных условиях размеры и конфигурация строительной площадки может быть изменена с
- учетом соблюдения требования безопасности производства работ. 9. В ППР разработать технологическую схему на пересечения с инженерными сетями.
- 10. ППР разрабатывается до начала земляных работ и после получении положительного заключения от экспертизы.
- 11. В случаи выезда спец. техники с площадки на территорию общего пользования, выполнить ряд мероприятий: предусмотреть реверсионое движение; – расстановка знаков; – расстановка информационных щитов
- 12. Виды работ отразить в схеме "Организации дорожного движения". Схему разработать на стадии ППР. Схему ОДД разрабатывает подрядно-строительная организация.

Работа крана вблизи линии электропередач (ЛЭП) связана с повышенной опасностью и требует строгого соблюдения норм безопасности:

- 1. Работа стреловых кранов вблизи ЛЭП должна проводиться под личным контролем лица, ответственного за безопасное проведение работ.
- 2. Скорость передвижения кранов вблизи линий электропередач ограничена.
- 3. Работы крана вблизи ЛЭП в тёмное время суток разрешены при отключённой линии электропередач и должном ировне освещения.
- 4. Запрещено устанавливать краны непосредственно под воздушной линией электропередач.

Экспликация зданий и сооружений							
N поз.	Наименование	Примечание					
1	Здание водоочистных сооружений	Проект.					
2	Здание ВОС	Сущ.					

Грузовысотные характеристики автокрана КС-55413

Расчет опасной зоны при работе крана

Согласно СНиП 12-03-2001 Приложение Г, границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении.

 $S = Lom_{I.} + Lz + 0.5 \cdot Bz$

где L отл – минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном;

Ls – наибольший забарит перемещаемого груза;

Bs – наименьший габарит перемещаемого груза.

Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, для высоты подъема груза 8,5 м составляет 4,0 м.


Для уменьшения опасной зоны производства работ монтаж элементов каркаса и металлической фермы выполнять с применением оттяжек.

При ведении разгрузочных работ грузы поднимать на высоту не более 3м от земли. Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, для высоты подъема 3 м составляет 1,1 м.

Согласно СНиП 12-03-2001 Приложение Г границы опасная зона падения груза со здания составляет 3,5 м при высоте здания до 12 м.

Ведомость временных дорожных знаков Количест Номер знака Наименование во Движение пешеходов запрещено Проход запрещен табличка Информационный щит производителя работ И.Щ.

Принципиальная схема комплекса мойки колес серии "Мойдодыр"

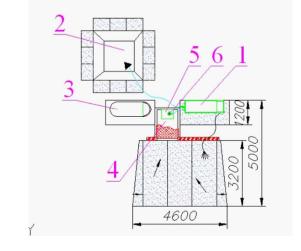

1-Установка "Мойдодыр-K-1(B)"; 2-Шламоприёмный кювет; 3-Система сбора 6-Насос погружной; 7-Песколовка.

Информационный щит производителя работ



Экспликация временных зданий и сооружений (стройгородок на период строительства)

		Параметры зданий			
№ n/n	Наименование	Размеры, м	Полезная площадь Sз (м2)	Расчетная площадь, м2	Кол-во зданий, шт
1	Контора начальника участка (прораба)	3x4x2,5	12	12	1
2	Помещение для приёма пищи	2x2x2,5	4	2,4	1
2	<u> Умывальная</u>	2,2,2,5	7	1,6	
3	Душевая	3x1,5x2,5	4,5	4,32	1
	Гардеробная			5,6	
	Респираторные			0,56	
4	Помещение для обогрева	3x3x2,5	9	0,8	1
	Помещение для сушки специальной одежды и обуви			1,6	
5	Уборная (биотуалет)	1x1x2,5	1	0,73	1
6	Пост охраны контейнерного типа	3x4x2,5	12	-	1
7	Контейнер для отходов ТБО	3,35x1,9x1,35	6,36	-	1
8	Медицинский пункт	3x4x2,5	12	-	1

Привязка проектируемого здания произведена в геодезических координатах. Все размеры даны в метрах.

						14 192.012/2024 – ΠΟΣ.ΓΥ				
изм.	кол. Уч	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	Модернизация объекта «Зди сооружений» в с.Г.				
Разработал		Девуш	кин		05.25	Проокт организации	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ	
Проверил		<i>Усвяцев</i>			05.25	Проект организации строительства	Р			
ГИП Н.контор.		<i>Усвяцев</i>			05.25		000 "M55"			
						Стройгенплан на монтаж ВОС 000		000 "MC	MLb"	
		Шамова		05.25						
